

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

27/02/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

FEVEREIRO

Nº FUNC.:

Metereologia

C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva (X)	Chuva (X)	SEGUNDA-FEIRA	Aditivo		dias

Efetivo na Obra

Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro		Pintor	1
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	1		


RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- FINALIZAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
- TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA
- CORTE DA PISO

- Relatório fotográfico



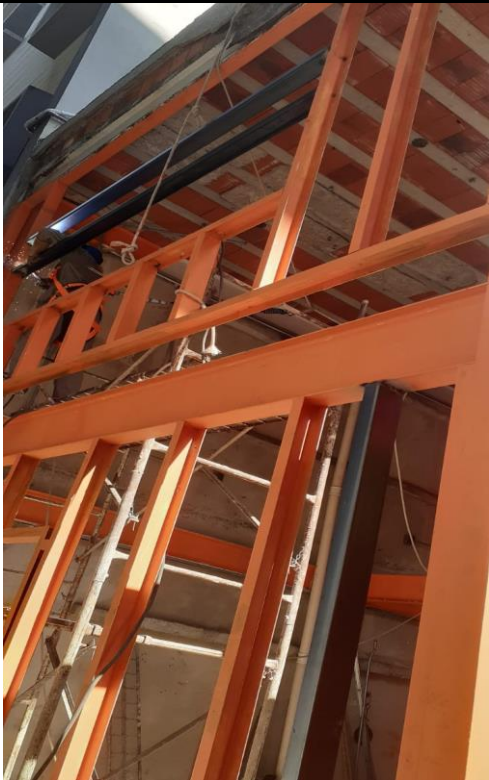

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	28/02/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	FEVEREIRO	Nº FUNC.:		
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	TERÇA-FEIRA	Aditivo	
	Efetivo na Obra						
Engenheiro		Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	1
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	1		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- INÍCIO DO REFORÇO DA ESTRUTURA METÁLICA							
- Relatório fotográfico							
							

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos– Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	01/03/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	FEVEREIRO	Nº FUNC.:		
Meteoreologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	QUARTA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	2	Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	2		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- CONTINUAÇÃO DO REFORÇO NA ESTRUTURA METÁLICA - ABERTURA DO CORTES PARA A VIGA BALDRAME - DOBRAGEM E MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS E PILARES							
- Relatório fotográfico							
							



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

02/03/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

FEVEREIRO

Nº FUNC.:

Meteoreologia

C L I M A	Período	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva ()	Chuva ()	QUINTA-FEIRA	Aditivo		dias

Efetivo na Obra


Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	2
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	2	Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	2		

RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- CONTINUAÇÃO DO REFORÇO NA ESTRUTURA METÁLICA
- CONTINUAÇÃO DA ABERTURA NO PISO PARA A VIGA BALDRAME
- FOI FEITA A ALTERAÇÃO NA POSIÇÃO DA PAREDE DA SALA DOS LÍQUIDOS CORROSIVOS. POIS AO QUABRAR O PISO FOI EVIDENCIADO QUE A POSIÇÃO DA PAREDE INVADIRIA 30CM A LAJE DA CASA DE MAQUINAS.
- MUDANÇA ALTORIZADA PELA FISCALIZAÇÃO DA UFCSPA.

- Relatório fotográfico



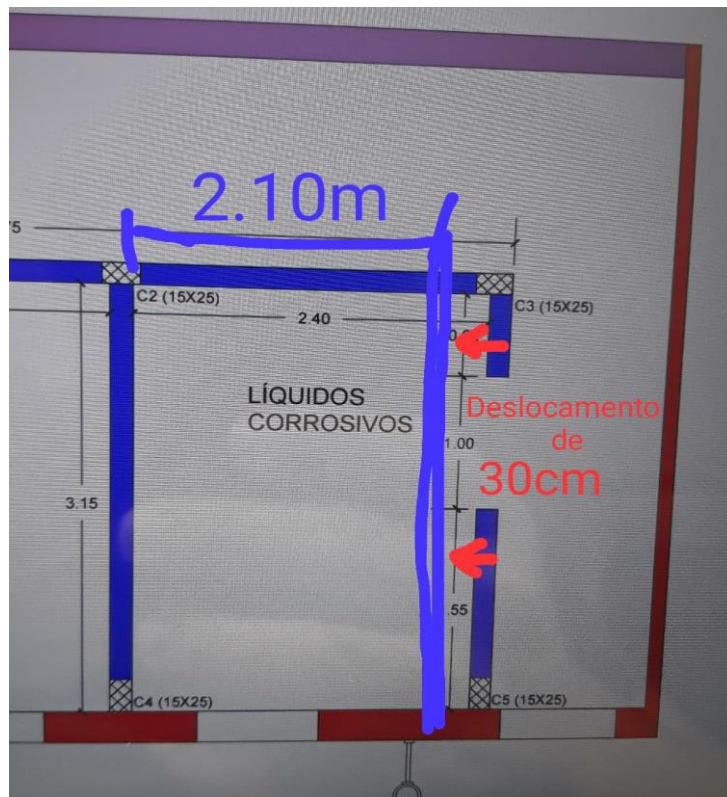

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

03/03/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

FEVEREIRO

Nº FUNC.:

Metereologia

C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom ()	Bom ()		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva (X)	Chuva (X)	SEXTA-FEIRA	Aditivo		dias

Efetivo na Obra

Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	2	Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	2		

RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- CONTINUAÇÃO NO REFORÇO DA ESTRUTURA METÁLICA
- CONTINUAÇÃO DA ABERTURA DA VALA PARA A VIGA BALDRAME
- FINALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA

- Relatório fotográfico



