

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	06/03/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	MARÇO	Nº FUNC.:		
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva (X)	Chuva (X)	SEGUNDA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	2	Pintor	1
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	2		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- FINALIZAÇÃO DA ABERTURA DA VALA PARA A VIGA BALDRAME - DIA CHUVOSO.							
- Relatório fotográfico							

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	07/03/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	MARÇO	Nº FUNC.:		
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	TERÇA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro		Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	1
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	1		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- EXECUÇÃO DA VIGA BALDRAME E ESPERA PARA PILARES -							
- Relatório fotográfico							
 							



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

08/03/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

MARÇO

Nº FUNC.:

Metereologia

C L I M A	Período	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva ()	Chuva ()	QUARTA-FEIRA	Aditivo		dias

Efetivo na Obra

Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro		Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente			

RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- CONTINUAÇÃO DO REFORÇO NA ESTRUTURA METÁLICA

- Relatório fotográfico



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

09/03/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

MARÇO

Nº FUNC.:

Metereologia

C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva ()	Chuva (x)	QUINTA-FEIRA	Aditivo		dias


Efetivo na Obra

Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	2
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	2	Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente	2		

RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- CONTINUAÇÃO DO REFORÇO NA ESTRUTURA METÁLICA
- REVESTIMENTO DA PLATIBANDA DA COBERTURA

- Relatório fotográfico

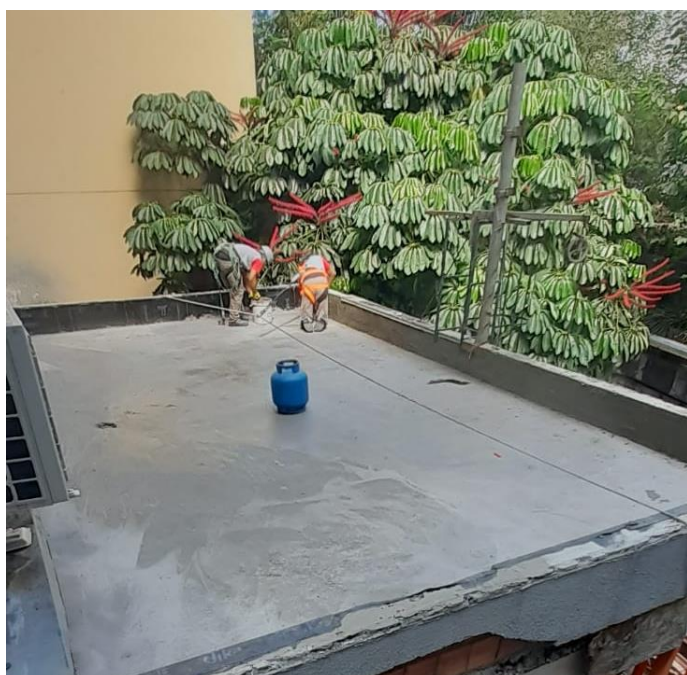

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE				DATA:	10/03/2023		
Contrato: 001/2022			MÊS:	MARÇO	Nº FUNC.:		
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/02/2023	
	Tempo	Bom (x)	Bom (x)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	SEXTA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro		Pintor	
Mestre de Obras	1	Encarreg. Armad.		Op. Betoneira		Serralheiro	1
Tec. Edificação		Meio Of. Armd		Servente			
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- CONTINUAÇÃO NO REFORÇO DA ESTRUTURA METÁLICA							
- Relatório fotográfico							
							
