
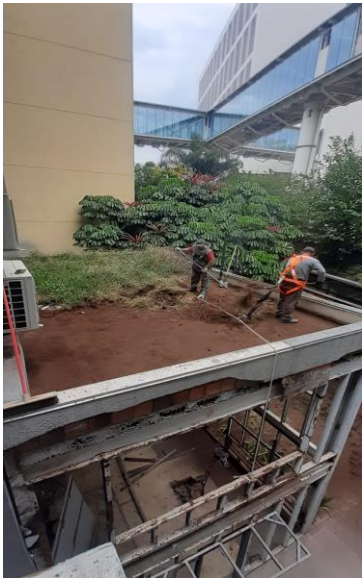


DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	06/02/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	FEVEREIRO	Nº FUNC.:	3	
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/01/2023	
	Tempo	Bom (X)	Bom (X)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	SEGUDA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro		Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança		Carpinteiro		Pedreiro		Pintor	
Mestre de Obras		Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação	1	Meio Of. Armd		Servente	2		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS TAPUMES E ISOLAMENTO DA OBRA							
- Relatório fotográfico							
 							

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos – Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	07/02/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	FEVEREIRO	Nº FUNC.:	4	
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/01/2023	
	Tempo	Bom (X)	Bom (X)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	TERÇA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança		Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	
Mestre de Obras		Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação	1	Meio Of. Armd		Servente	1		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TAPUMES E ISOLAMENTO DA OBRA							
- Relatório fotográfico							
							

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE				DATA:		08/02/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS: FEVEREIRO		Nº FUNC.:		3
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/01/2023	
	Tempo	Bom (X)	Bom (X)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	QUARTA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro		Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança		Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	
Mestre de Obras		Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação	1	Meio Of. Armd		Servente	1		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TAPUMES E ISOLAMENTO DA OBRA - INÍCIO DA LIMPEZA DA ÁREA							
- Relatório fotográfico							
 							

DIÁRIO DE OBRAS							
CONTRATANTE: UFCSPA							
CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI							
OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA para atualização como almoxarifado de químicos– Prédio 3							
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE					DATA:	09/02/2023	
Contrato: 001/2022			MÊS:	FEVEREIRO	Nº FUNC.:	5	
Metereologia							
C L I M A	Periodo	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/01/2023	
	Tempo	Bom (X)	Bom (X)		Prazo Contratual	150	dias
			Chuva ()	Chuva ()	QUINTA-FEIRA	Aditivo	
Efetivo na Obra							
Engenheiro	1	Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança	1	Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	
Mestre de Obras		Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação	1	Meio Of. Armd		Servente	1		
RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:							
- LIMPEZA DA LAJE E REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO - INÍCIO DA LIXAÇÃO E TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA							
- Relatório fotográfico							
 							

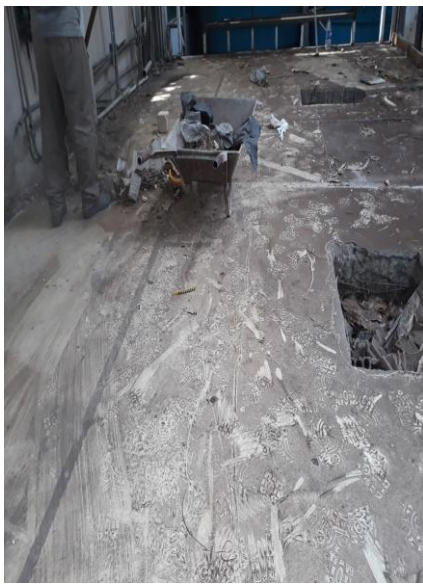

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: UFCSPA

CONTRATADA: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Reforma e readequação de prédio anexo a UFCSPA
para atualização como almoxarifado de químicos- Prédio 3

Construtec
CONSTRUTORA

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

DATA:

10/02/2023

Contrato: 001/2022

MÊS:

FEVEREIRO

Nº FUNC.:

3

Metereologia

C L I M A	Período	Matutino	Vespertino	Dia da semana	Início Contratual	01/01/2023	
	Tempo	Bom (X)	Bom (X)		Prazo Contratual	150	dias
		Chuva ()	Chuva ()	SEXTA-FEIRA	Aditivo		dias

Efetivo na Obra

Engenheiro		Encarreg. Carp.		Encarreg. Pedr.		Eletricista	
Arquiteto		Feitor Carp.		Feitor Pedr		Hidraulico	
Tec. Segurança		Carpinteiro		Pedreiro	1	Pintor	
Mestre de Obras		Encarreg. Armad.		Op. Betoneira			
Tec. Edificação	1	Meio Of. Armd		Servente	1		

RELATO DA EMPRESA CONTRATADA:

- RETIRADA DE CALHAS
- LIMPEZA DA LAJE COM LAVA JATO
- CONTINUAÇÃO DA LIXAÇÃO E TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

- Relatório fotográfico



